

Ett renare Östergötland

Resultat och slutsatser från tillsynsprojekt
"Ett renare Östergötland", 2008



Projektidé

Syftet med projektet var att riskklassa ett antal pågående verksamheter inom branscher där det typiskt sett finns risk för förorening av t ex mark och grundvatten enligt MIFO-fas 1. Detta är en relativt ny arbetsuppgift för kommunerna och i princip hade ingen kommun tidigare riskklassat någon pågående verksamhet enligt MIFO. Underlag för riskklassningen togs fram av verksamhetsutövaren medan riskklassningen utfördes av tillsynsmyndigheten. Inom projektet ingick även utbildning om MIFO för både verksamhetsutövare och inspektörer. Målsättningen var att riskklassa 40 pågående verksamheter i länet.

Genomförande

Kommunerna valde själva utifrån tillgängliga resurser ett antal pågående verksamheter som ska riskklassas och inventeras enligt MIFO-fas 1. Informationsbrev och föreläggande skickades ut till företagen om att ta fram underlaget till riskklassning. I flera fall behövde handlingarna kompletteras och platsbesök utföras. Inkomna uppgifter sammanställdes i MIFO-databasen och verksamheterna riskklassades på riskklassningsmöten. Information om tilldelad riskklass skickades ut till respektive företag. Projektet pågick från 2007 till juni 2008.

Följande material har tagits fram inom projektet och finns på MÖTA:s hemsida (www.e.lst.se/e/amnen/Miljo/miljosamverkan):

- Utkast till föreläggande
- Broschyren *Är Ditt område förorenat?*

Utbildning

Inom projektet erbjöds också utbildning om MIFO för både verksamhetsutövare och inspektörer.

Utbildningstillfälle om MIFO-fas 1 för inspektörer och riskklassning anordnades två gånger. På utbildningen deltog 32 inspektörer från 9 kommuner. Utbildningen hölls av personal från Länsstyrelsen som ingick i projektgruppen.

Ett kortare seminarium om förorenade områden och inventering enligt MIFO-fas 1 anordnades för verksamhetsutövarna vid två tillfällen (ett kvällspass och ett dagpass). På kvällspasset deltog 19 personer från 12 verksamheter och på dagpasset deltog 22 personer från 16 verksamheter. Seminariet hölls av projektgruppen.

För inspektörerna anordnades gemensamma riskklassningsmöten för att få en samordning och likartad bedömning i länet. Totalt arrangerades 6 riskklassningsmöten där 18 inspektörer deltog från 7 kommuner. Riskklassningsmötena hölls av personal från Länsstyrelsen som har erfarenhet av inventering enligt MIFO.



*En bortglömd deponi?
Foto: Länsstyrelsen*



Broschyren - Är Ditt område förorenat?

Resultat

I projektet deltog 9 kommuner av länets 13 vilket får anses som bra uppslutning.

Deltagarantalet på utbildningsinsatserna har varit över förväntan och kunskapen om MIFO har ökat i länet som ett resultat av projektet.

Totalt anmäldes 42 verksamheter till projektet från 8 kommuner. Vid projektets avslut har 29 verksamheter tilldelats en riskklass. Målsättningen var att riskklassa 40 pågående verksamheter i länet och projektet lyckades alltså inte fullt ut med detta (ca 70 % måluppfyllelse).

Av de 29 riskklassade verksamheterna i länet tilldelades 9 objekt riskklass 2, 18 objekt riskklass 3 och 2 objekt riskklass 4.

- Riskklass 1= Mycket stor risk
- Riskklass 2= Stor risk
- Riskklass 3= Måttlig risk
- Riskklass 4= Liten risk
- Har ännu ej riskklassats

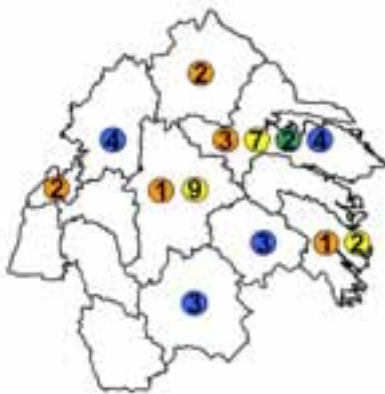


Bild över antal objekt per riskklass för respektive kommun

Slutsatser och erfarenheter

Projektet genomfördes i stort enligt projektplan (tidplanen förlängdes dock 6 månader). Idén att samköra med tillsynsprojektet "Hamn och båt miljö" fungerade dock inte bra. Endast ett objekt ingick i båda projekten.

Behovet av utbildning var stort, det visar antal deltagare på utbildningstillfällena. Det var dock stor variation på deltagarnas förhandskunskaper, vilket innebär att det var svårt att utvärdera resultatet. En del hade lärt sig jättemycket med andra endast kunde tillgodogöra sig en mindre del av utbildningen.

När det gäller riskklassningsarbetet som utfördes av inspektörerna var det mer tidskrävande än beräknat, troligtvis eftersom arbetsuppgiften inte tidigare utförts. Vidare har det varit svårt för inspektörerna att prioritera denna arbetsuppgift och därför har några inte hunnit med att riskklassa verksamheterna trots att projektet förlängdes med 6 månader jämfört med ursprungsplanen. Under tiden har också några inspektörer slutat. Detta är förklaringen till att antalet riskklassade verksamheter blev lägre än förväntat.

Projektgruppen tycker framförallt att det fungerat bra med utbildningsinsatsen och de gemensamma riskklassningsmötena för inspektörerna och föreslår därför att det i länet anordnas MIFO-utbildning och riskklassningsmöten varje år. Det kommer annars vara svårt, framför allt för de mindre kommunerna, att fortsätta med inventeringsarbetet. Fortfarande kvarstår i länet ca 500 objekt som ska inventeras och riskklassas.

Tabell som visar riskklassfördelningen för respektive bransch

Bransch	●	●	●
Verkstadsindustri	5	8	
Skjutbana	1	2	
Bilskrot och Skrothandel	2	3	
Anläggning för miljöfarligt avfall		3	
Övrigt	1	2	2
Totalt	9	18	2

Projektgruppen

Projektgruppen har bestått av följande personer:

- Anna Ohlsson, Linköpings kommun
- Magnus Jansson, Linköpings kommun
- Susanne Karlsson, Länsstyrelsen Östergötland
- Ann-Christine Wiklander, Länsstyrelsen Östergötland
- Madeleine Andersson, Norrköpings kommun
